

【工事だより】新宮川岸地区土地改良事業

2026 年 2 月号

隣組回覧

東海旅客鉄道(株) 中央新幹線長野工事事務所

中央新幹線トンネル工事発生土を活用した「新宮川岸地区土地改良事業」の工事につきまして、地域の皆様には、ご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

本事業のうち造成工事は本年3月末に完了予定でしたが、圃場整備計画の決定に時間を要し、道路擁壁の工事着手が遅れたため、本年9月末まで工事にかかる見込みとなりましたのでお知らせいたします。なお、圃場整備の完成時期は、現時点では2027年3月末完了を目途に計画を立てています。地域の皆様には大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解とご協力の程よろしくお願い申し上げます。

○今後の工程（造成工事）

		2025年			2026年								
		10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
盛土材の運搬・搬入													
盛土工													
道路擁壁工	大型ブロック積擁壁												
	L型擁壁												


○工事の進捗状況

- 盛土材の運搬搬入、盛土工及び道路擁壁工を行っています。並行して国土交通省による美和ダム堆積土（心土）の搬入及び仮置きを行っています。
- 盛土工について、新宮川側の区画は概ね完了しました。今後は、新宮川岸交差点付近、駒ヶ根長谷線側の区画の順に、盛土の仕上げを行っていきます。
- 盛土材搬入の進捗率は、約8割（約19万m³／約25万m³）です。



（裏面もご参照ください）

○盛土材運搬車両の通行状況

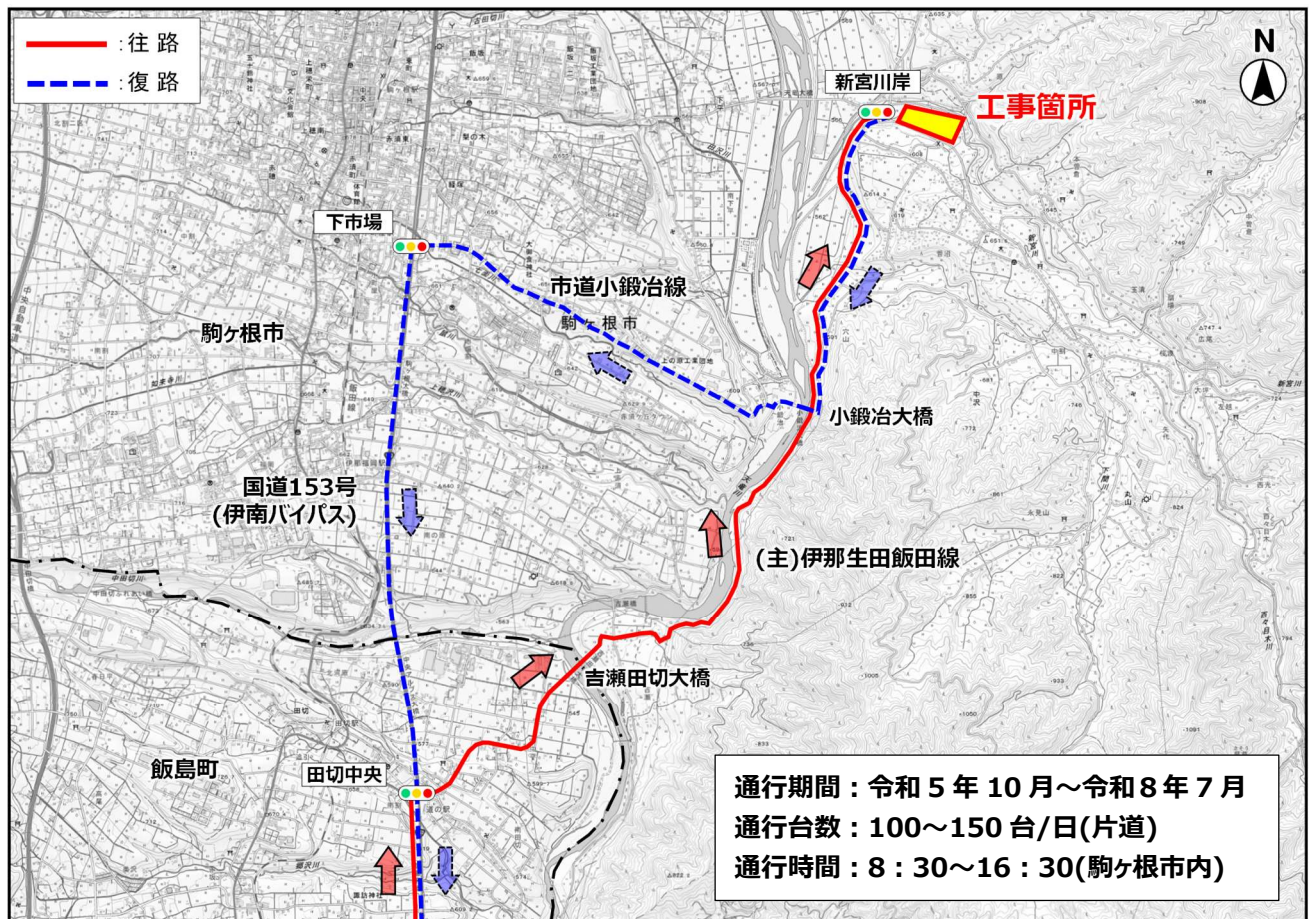

○造成工事に関するお問い合わせ先

東海旅客鉄道株式会社 中央新幹線長野工事事務所 大鹿分室
(住所) 下伊那郡大鹿村大字大河原 381-1
(電話) 0265-39-2975
