
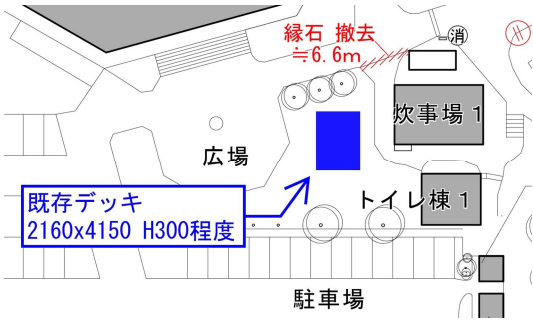


# 質問回答書

令和 8 年 5 月 26 日

令和8年5月22日提出の質問（7項目）に対しまして、下記のとおり回答します。


工 事（業務）名	令和8年度 高原観光地整備事業 駒ヶ根キャンプセンターリニューアル工事
----------	--

質問番号	質 問 事 項	回 答 欄
1	<p>(設計図 A-07, A-08)</p> <p>現地調査にて、炊事場 1 西側に既存デッキ (2160x4150 H300 程度) を確認いたしました。</p>  <p>図面には記載が無いので、こちらは現況のままと考えて宜しいでしょうか。</p> <p>(下図の青塗りの位置)</p> 	<p>&lt;質問番号 1 回答&gt;</p> <p>既存デッキは、現況のままで良いです。</p>
2	<p>(設計図 A-07)</p> <p>現地調査にて、コテージ C-5 北側にピンクテープの貼られた樹木等を確認いたしました。</p>	<p>&lt;質問番号 2 回答&gt;</p> <p>既存樹木は、現況のままで良いです。</p> <p>&lt;</p>



図面には記載が無いので、こちらは現況のままと考えて宜しいでしょうか。

(下図の雲マークの辺り)

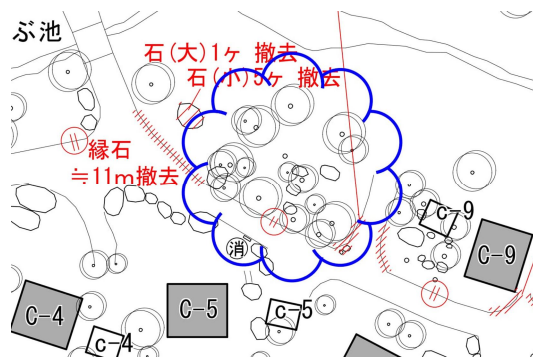

- 3 (設計図 A-22, A-23)  
ツリーハウス棟について、改修後の壁及び天井のGWの仕様ですが内部仕上表には16Kと記載がありますが、矩計図では10Kとなっております。内部仕上表の16Kが正と考えて宜しいでしょうか。

<質問番号 3 回答>

設計図A-22 仕上表及び内訳書P-33 のとおり16Kが正です。

- 4 (設計図 A-29, A-31)  
トイレ棟2の床の仕上げについて、内部仕上表に既存撤去後、磁器質100角タイル張とありますが、矩計図では金ごて仕上 保護塗装となっております。こちらはトイレ棟1と同様、金ごて仕上 保護塗装(タイル張は無し)と考えて宜しいでしょうか。

<質問番号 4 回答>

設計図A-31のとおり金ごて仕上 保護塗装を正としますが、施工上納まらない場合は協議によります。

- 5 (設計図 A-08, A-19)  
コテージ棟の階段ポーチの改修箇所について、A19図及び工事内訳書に10棟(10ヶ所)と記載がありますが、C-2棟の階段ポーチ

<質問番号 5 回答>

設計図A-08 及び内訳書P-35 のとおり改修箇所は9棟(9ヶ所)とする。

	<p>は既存のままとし、改修箇所は9棟(9ヶ所)で宜しいでしょうか。</p> <p>6 (設計図 A-27, A-31) トイレ棟1・トイレ棟2のライニングのLGS下地が工事内訳書には計上されておりませんでした。こちらは工事項目として追加計上して宜しいでしょうか。</p> <p>7 (設計図 A-07) 石の撤去について、図面及び工事内訳書には場外処分の記載がありませんので、石割後に現地処理と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>&lt;質問番号 6 回答&gt; ライニングLGS下地は協議により変更対象とします。</p> <p>&lt;質問番号 7 回答&gt; 場外処分で想定しています。 費用は、発生材積込・運搬・処分のがれき類に含んでいますが、協議によります。</p>
--	--	---
